

Points projet

Cycle de vie complet d'une instance de gouvernance projet — de la création du point à la diffusion du compte-rendu. Vingt écrans, et ce que chacun doit faire.

11

écrans du cycle de vie
onglet « Points projet »

09

écrans transverses
Cycles de pilotage

06

types d'instance
COPROJ · COPIL · COTECH · CODIR · Revue · Ad hoc

PARTIE A

Cycle de vie du point projet

Onglet « Points projet » de la fiche projet. Un point traverse six états — à préparer, à venir, en cours, à finaliser, historique — et s'appuie sur des séries pour sa cadence.

À préparer

À venir


En cours

À finaliser

Historique

01 Points projet — À préparer

LISTE

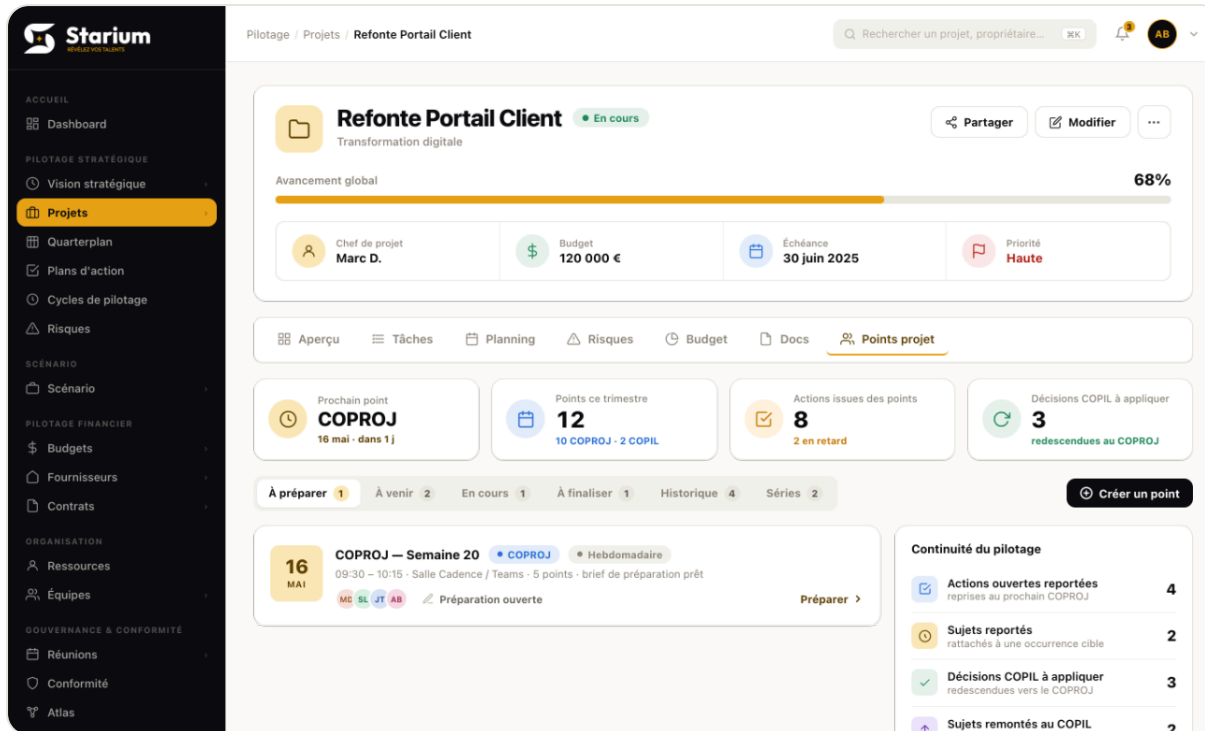

RÔLE

Point d'entrée de la brique. L'onglet « Points projet » de la fiche projet regroupe tous les comités rattachés au projet, filtrés par état d'avancement.


CE QUE FAIT L'ÉCRAN

- Affiche 4 indicateurs de tête : prochain point, volume du trimestre, actions issues des points, décisions COPIL à appliquer.
- Le sous-onglet « À préparer » ne montre que les séances dont l'ordre du jour n'est pas figé.
- Chaque ligne porte la date, le type (COPROJ, COPIL...), la cadence, les participants et l'état de préparation.
- Le bouton « Créer un point » ouvre la modale de création.
- Le lien « Préparer » ouvre l'écran de préparation de la séance.

Sortie : écran de préparation (voir 08) ou modale de création (voir 07).

02 Points projet — À venir

LISTE

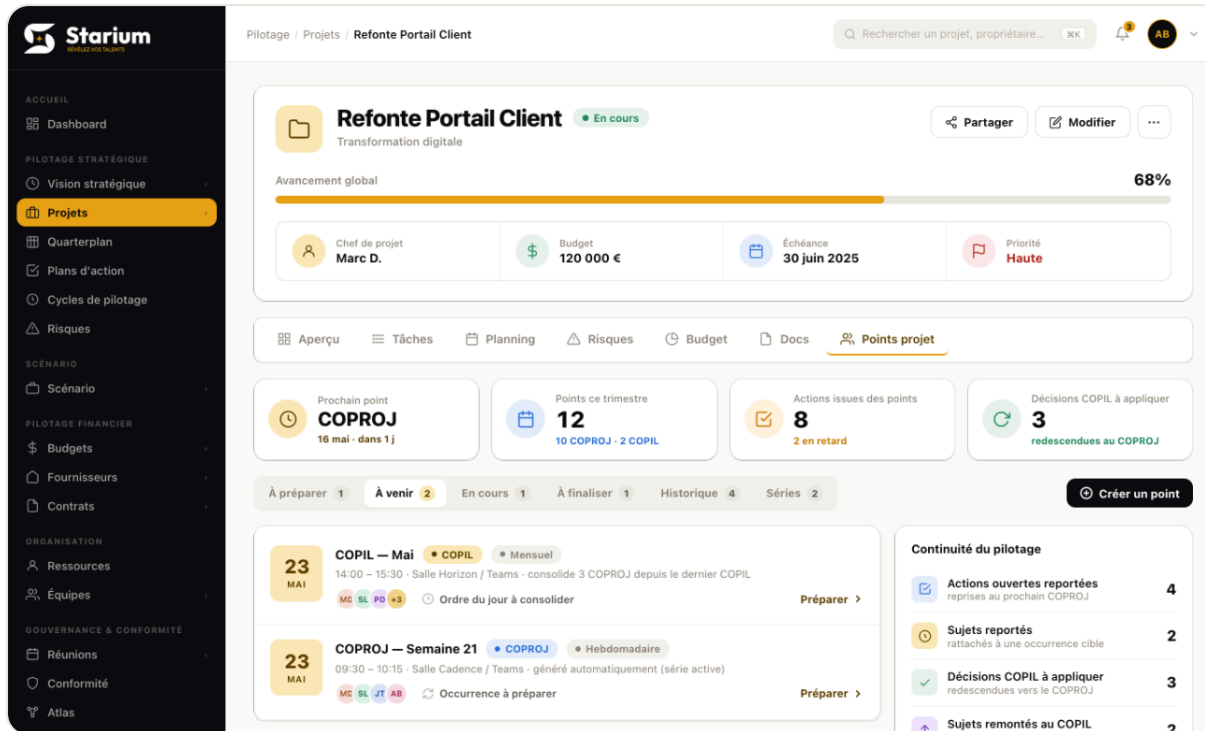

RÔLE

Séances planifiées dont la préparation est terminée ou en cours de consolidation.


CE QUE FAIT L'ÉCRAN

- Regroupe les points datés et confirmés, sans action immédiate requise.
- Le COPIL affiche explicitement le nombre de COPROJ qu'il consolide depuis la séance précédente — c'est le lien de remontée entre les deux niveaux.
- Permet de vérifier la cadence réelle par rapport à la série définie.
- Chaque ligne reste modifiable tant que la séance n'a pas démarré.

Sortie : préparation, ou passage automatique en « En cours » à l'heure de la séance.

03 Points projet — En cours

LISTE

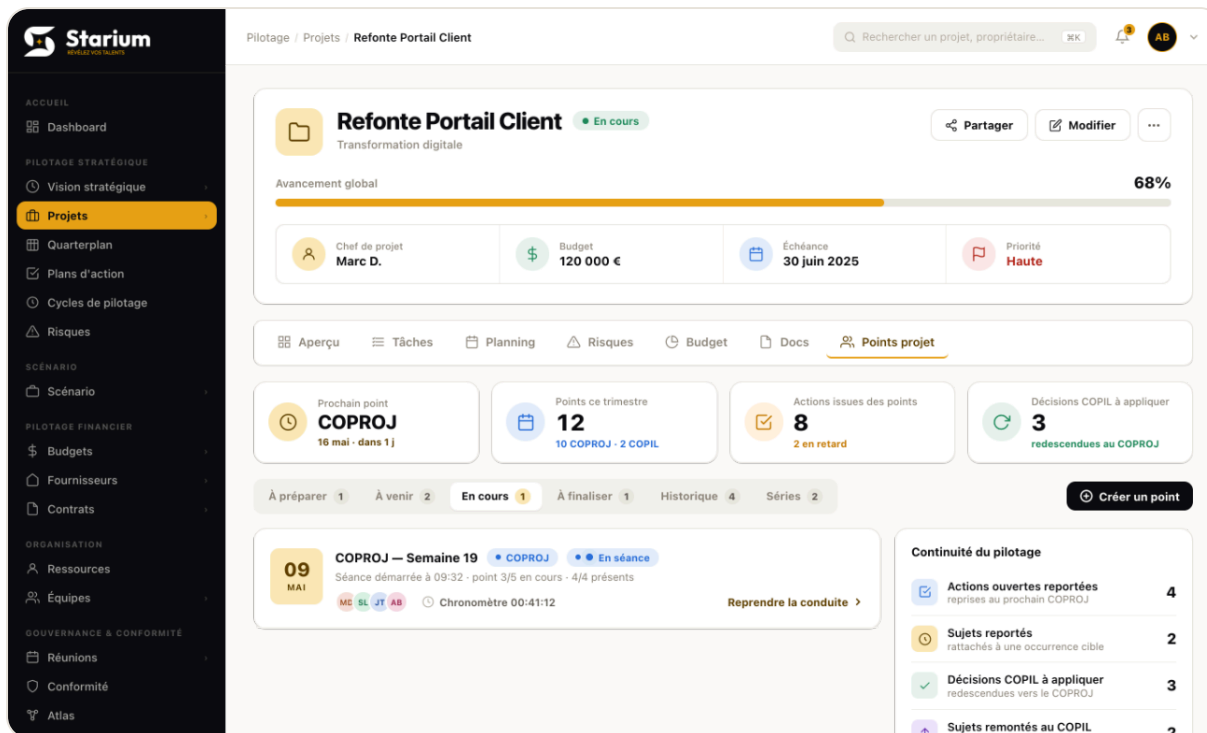

RÔLE

Séances démarrées et non closes. Un seul point est normalement en cours à un instant donné.


CE QUE FAIT L'ÉCRAN

- Affiche l'heure de démarrage réelle, l'avancement dans l'ordre du jour (point 3/5) et le taux de présence constaté.
- Le lien « Reprendre la conduite » rouvre l'écran d'animation là où il a été laissé — la séance survit à une fermeture d'onglet.
- Sert de garde-fou : un point resté « en cours » signale une séance jamais clôturée.

Sortie : écran d'animation de séance (voir 09).

04 Points projet — À finaliser

LISTE

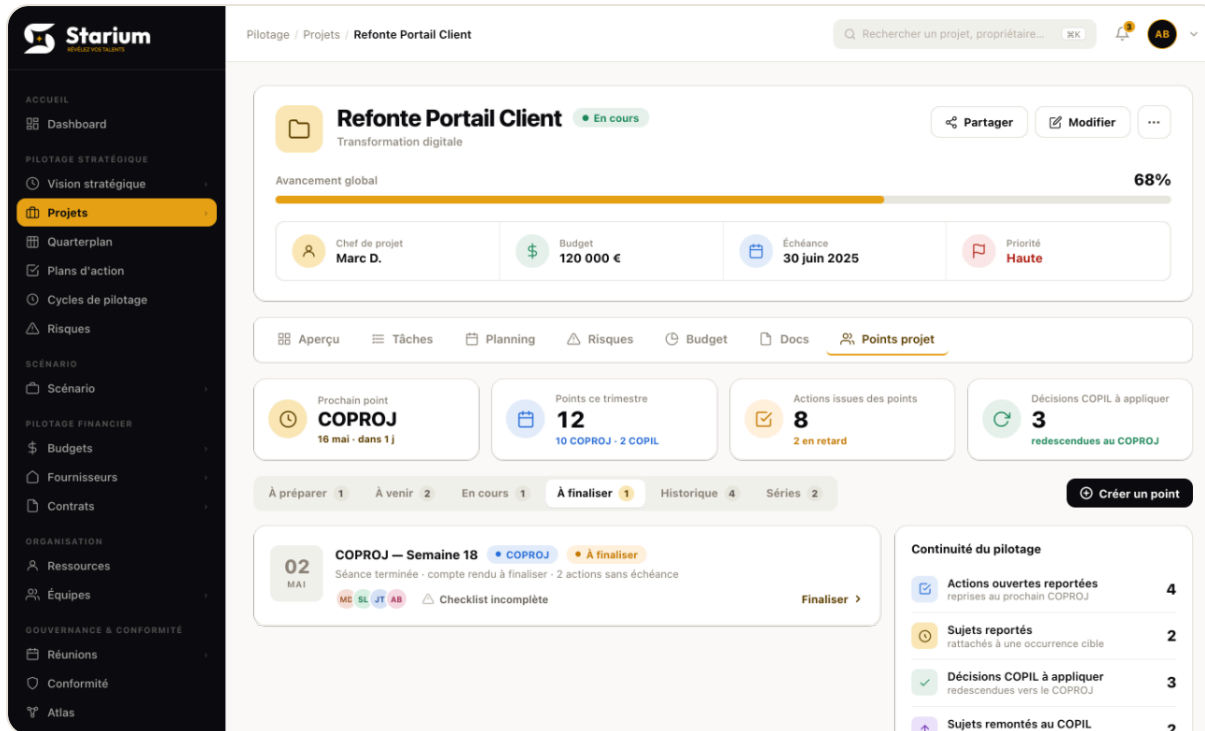

RÔLE

Séances tenues dont le compte-rendu n'est pas encore validé ni diffusé.


CE QUE FAIT L'ÉCRAN

- File d'attente de la gouvernance : tant qu'un point est ici, ses décisions ne sont pas opposables.
- Signale les arbitrages restés sans verdict et les actions sans porteur ou sans échéance.
- Le lien « Finaliser » rouvre la séance en mode rédaction pour compléter puis diffuser.

Sortie : diffusion du CR, le point bascule en « Historique ».

05 Points projet — Historique

LISTE

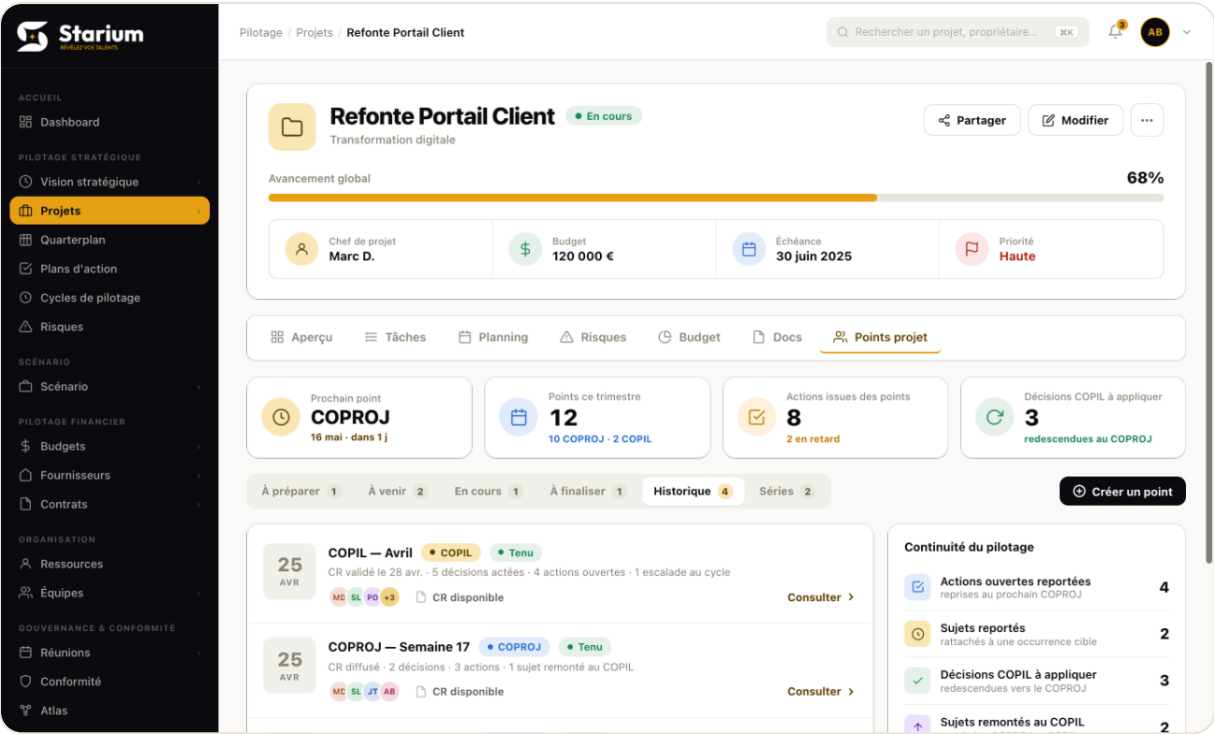

RÔLE

Archive des séances closes, CR validé et diffusé.

CE QUE FAIT L'ÉCRAN

- Chaque ligne rappelle le nombre de décisions actées et d'actions ouvertes issues de la séance.
- Le lien « Consulter » ouvre le compte-rendu en lecture seule (voir 19).
- Constitue la piste d'audit de la gouvernance projet : qui a décidé quoi, quand, avec quels présents.

Sortie : consultation du CR. Aucune modification possible.

06 Points projet — Séries

CONFIGURATION

The screenshot shows the Starium software interface. The left sidebar contains navigation menus for 'ACCUEIL', 'PILOTAGE STRATÉGIQUE', 'SCÉNARIO', 'PILOTAGE FINANCIER', 'ORGANISATION', and 'GOUVERNANCE & CONFORMITÉ'. The main content area is titled 'Pilotage / Projets / Refonte Portail Client'. It shows a project card for 'Refonte Portail Client' with a status of 'En cours' and a progress bar at 68%. Below the card, there are tabs for 'Aperçu', 'Tâches', 'Planning', 'Risques', 'Budget', 'Docs', and 'Points projet'. The 'Points projet' tab is active, showing a 'Prochain point COPROJ' on May 16th, 'Points ce trimestre' (12 total, 10 COPROJ, 2 COPIL), 'Actions issues des points' (8 total, 2 en retard), and 'Décisions COPIL à appliquer' (3 redescendues au COPROJ). A summary bar shows the status of various stages: 'À préparer' (1), 'À venir' (2), 'En cours' (1), 'À finaliser' (1), 'Historique' (4), and 'Séries' (2). The 'Séries de réunions' section shows a series for 'COPROJ — Comité projet' with details on frequency, duration, and generation mode.

RÔLE

Définition des cadences récurrentes plutôt que des séances unitaires.

CE QUE FAIT L'ÉCRAN

- Une série porte le type d'instance, sa fréquence, sa durée standard, sa salle et son équipe permanente.
- Les séances futures sont générées à partir de la série : créer une série évite de recréer chaque point à la main.
- Modifier une série n'altère pas les séances déjà tenues.
- Le bouton « Nouvelle série » crée une cadence complète en une fois.

Sortie : les séances générées apparaissent dans « À venir ».

07 Créer un point projet

MODALE

The screenshot shows the 'Créer un point projet' modal in the Starium application. The modal is titled 'Créer un point projet' and includes a subtitle 'La préparation détaillée s'ouvre après la création.' Below the title, there are several input fields and buttons:

- Type d'instance ***: Two radio buttons, 'COPROJ' (selected) and 'COPIL'.
- Titre**: A text input field with a placeholder 'Ex : COPROJ — Semaine 22'.
- Objectif de la séance**: A text input field with a placeholder 'Ex : suivi hebdomadaire des chantiers et blocages'.
- Équipe ou série**: A dropdown menu with 'COPROJ hebdomadaire' selected.
- Date (facultative)**: A date input field with a placeholder 'dd/mm/yyyy' and a calendar icon.
- Modèle d'ordre du jour**: A dropdown menu with 'Modèle COPROJ standard (5 points)' selected.

At the bottom of the modal, there are two buttons: 'Annuler' and 'Créer et préparer'.

RÔLE

Création unitaire d'une séance rattachée au projet courant.


CE QUE FAIT L'ÉCRAN

- Le type d'instance conditionne l'ordre du jour type, la durée par défaut et la liste des participants proposés.
- Date, heure, durée et lieu sont saisis dans la même modale — pas de second écran.
- Les participants sont pré-cochés depuis l'équipe projet et restent ajustables.
- La validation crée le point et ouvre directement sa préparation.

Sortie : écran de préparation, point ajouté à « À préparer ».

08 Préparation de la séance

ÉCRAN DE TRAVAIL

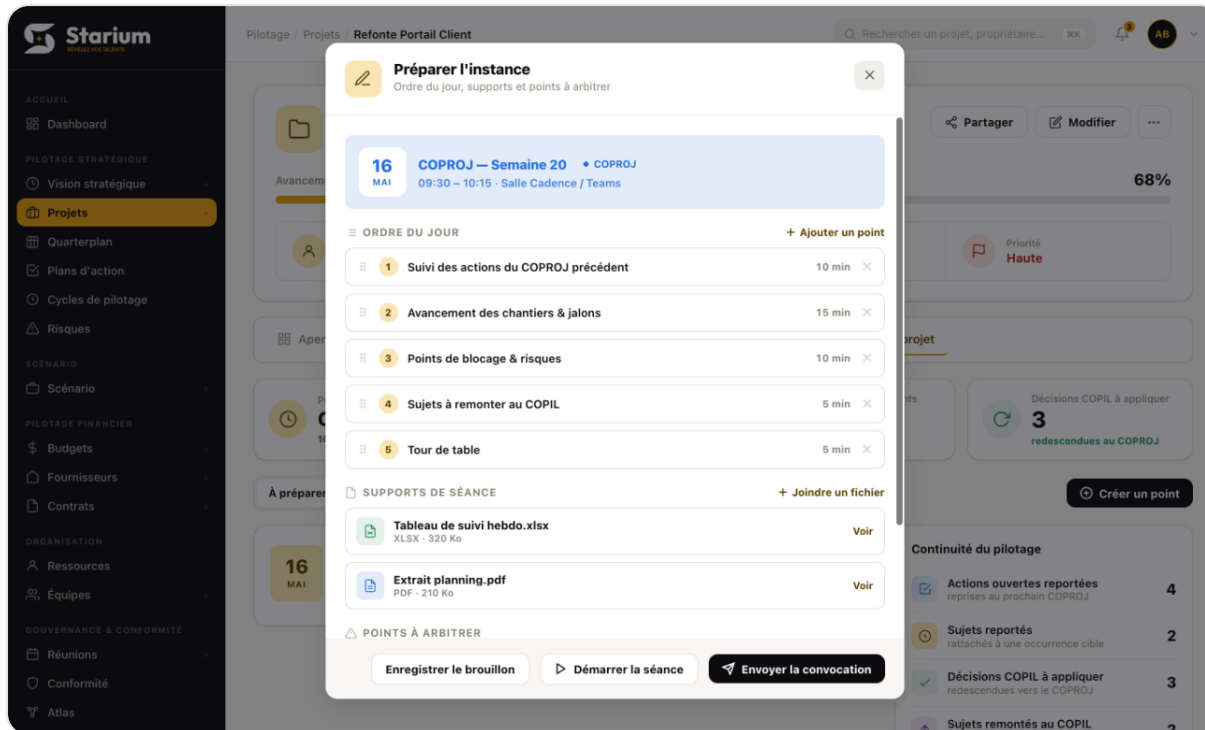

RÔLE

Construction de l'ordre du jour avant la séance. C'est ici que se joue la qualité du comité.


CE QUE FAIT L'ÉCRAN

- Reprend automatiquement les actions ouvertes et les décisions non appliquées du point précédent.
- Chaque point de l'ordre du jour reçoit un porteur, une durée cible et un type (information, décision, arbitrage).
- Les documents support sont rattachés point par point, pas en vrac.
- Un brief de préparation est diffusable aux participants avant la séance.
- Tant que l'ordre du jour n'est pas figé, le point reste en « À préparer ».

Sortie : ordre du jour figé → le point passe en « À venir ».

09 Séance en cours — conduite

ÉCRAN DE TRAVAIL

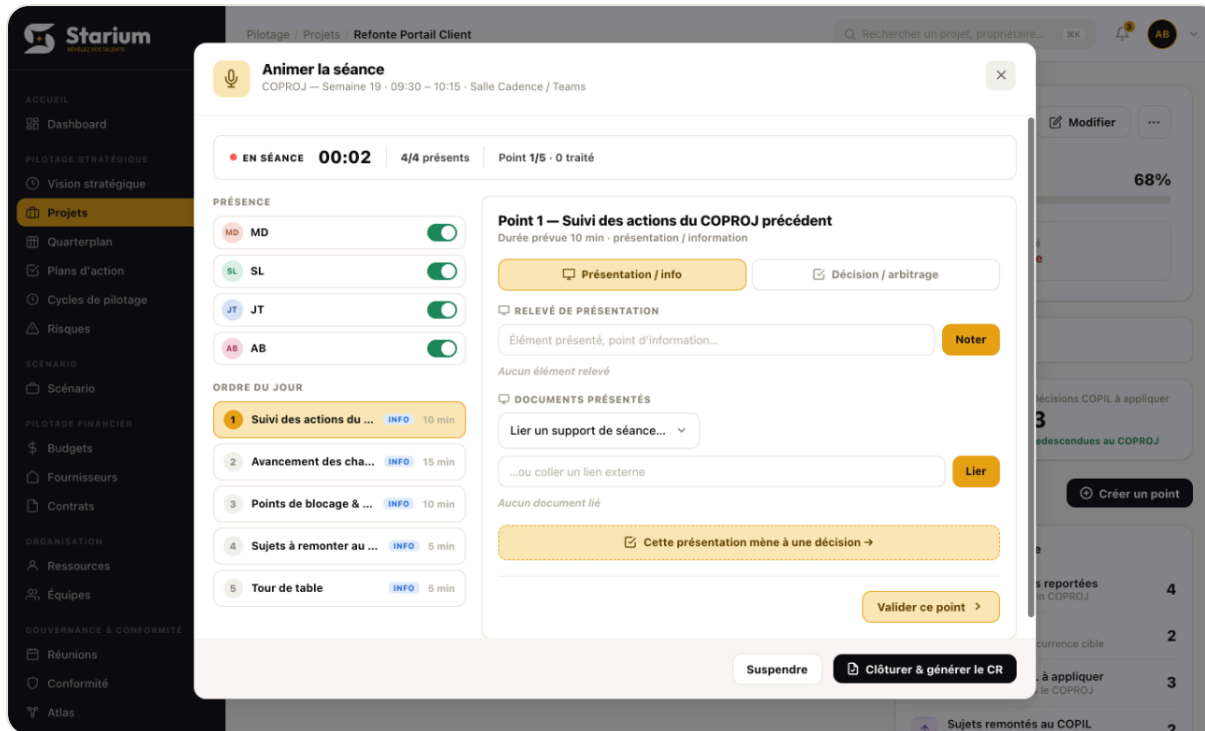


RÔLE

Animation live du comité : on déroule l'ordre du jour et on saisit au fil de l'eau.

CE QUE FAIT L'ÉCRAN

- Chronomètre de séance et minuteur par point pour tenir la durée.
- Émargement en un clic : présents / absents figés dans le CR.
- Pour chaque point : notes, décisions, arbitrages avec verdict (adopté, rejeté, reporté), risques et actions.
- Une décision peut être routée immédiatement en action, en risque ou en sujet à remonter.
- « Point suivant » clôt le point courant et fait avancer le stepper.

Sortie : dernier point clos → passage en « À finaliser ».

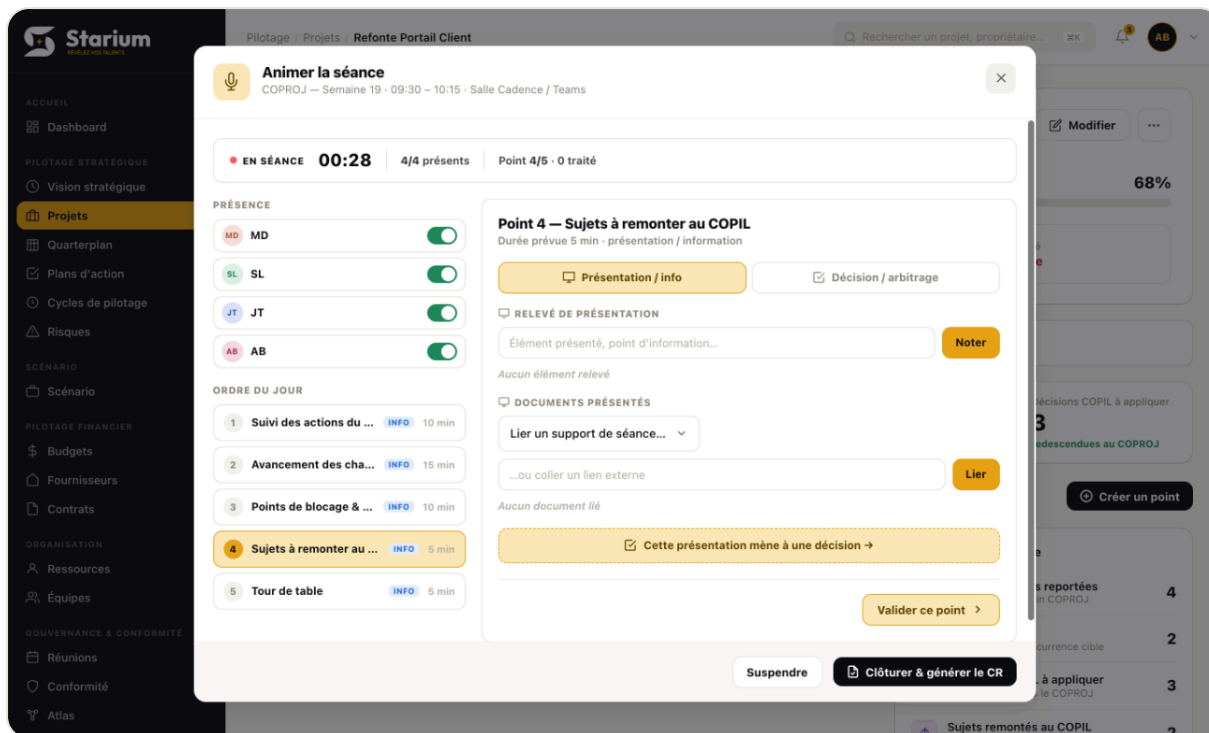


RÔLE

Point d'ordre du jour dédié à l'articulation entre les niveaux de gouvernance.

CE QUE FAIT L'ÉCRAN

- Les sujets qualifiés « à remonter » alimentent automatiquement l'ordre du jour du prochain COPIL.
- Évite la double saisie et la perte de sujets entre le comité opérationnel et le comité de pilotage.
- Chaque remontée conserve son contexte : point d'origine, séance, date, porteur.
- Symétriquement, les décisions COPIL redescendent au COPROJ suivant.

Sortie : ordre du jour du COPIL pré-alimenté.

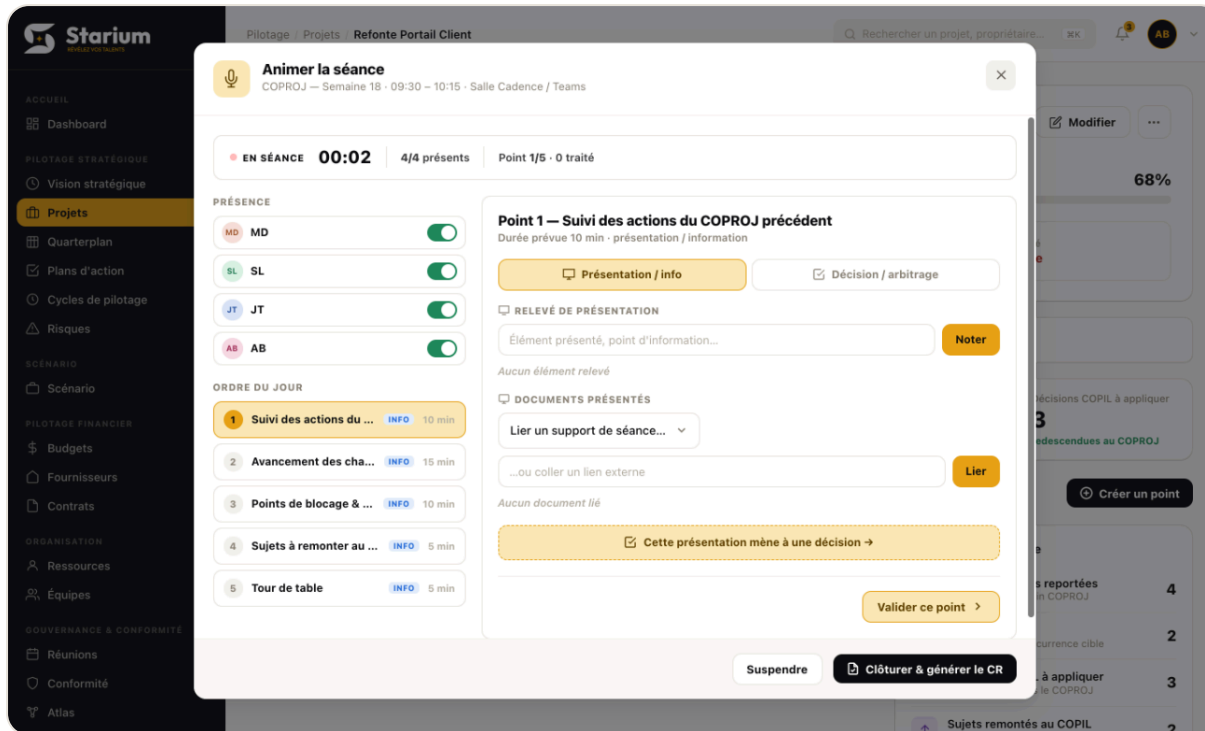

RÔLE

Relecture et diffusion du compte-rendu après la séance.

CE QUE FAIT L'ÉCRAN

- Le CR est généré depuis la saisie live : rien n'est retapé.
- Contrôles de complétude : arbitrages sans verdict, actions sans porteur ou sans échéance sont signalés.
- La diffusion notifie les participants et verrouille le contenu.
- Les actions créées partent dans le plan d'action projet, les risques dans le registre des risques.

Sortie : CR diffusé, point archivé en « Historique ».

PARTIE B

Création et pilotage transverses


Vue « Cycles de pilotage », hors fiche projet. Création typée en un clic, consolidation entre niveaux de gouvernance, calendrier de cadence.

Créer

Préparer

Animer

Diffuser

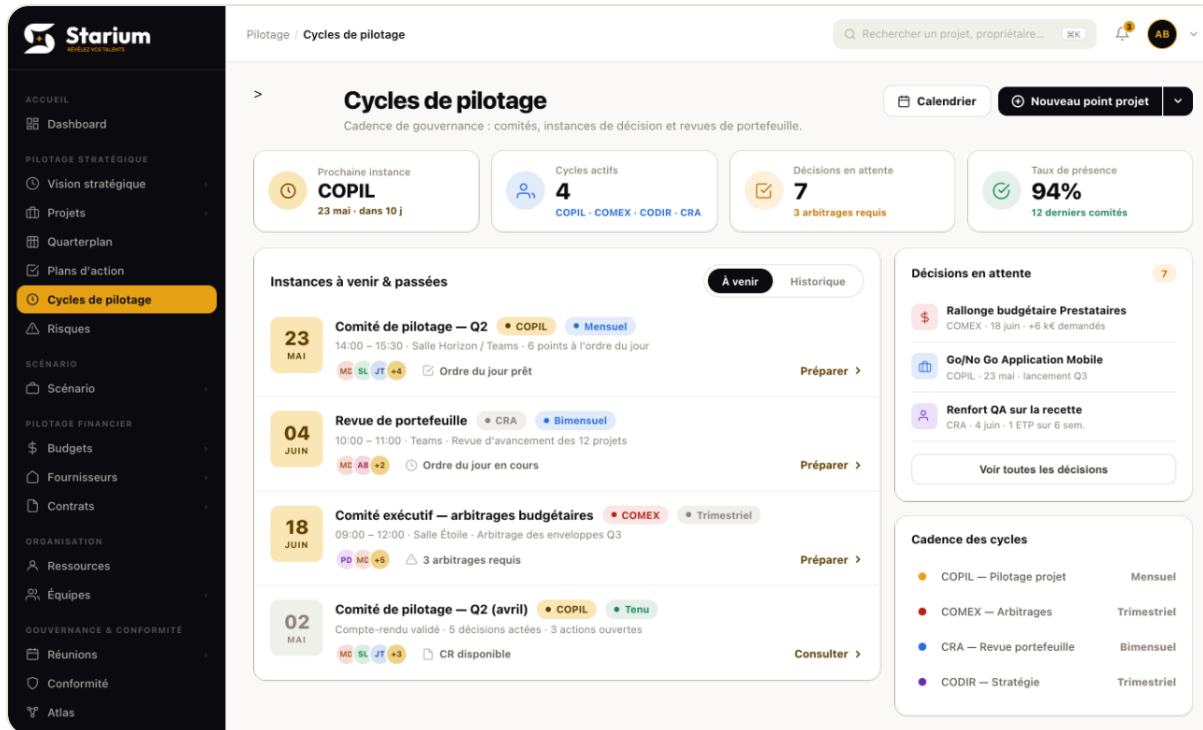


RÔLE

Vue transverse, hors fiche projet : toutes les instances de gouvernance, tous projets confondus.

CE QUE FAIT L'ÉCRAN

- Indicateurs de tête : prochaine instance, cycles actifs, décisions en attente, taux de présence.
- Liste unifiée des instances à venir et passées, basculable par le segment « À venir / Historique ».
- Colonne latérale : décisions en attente d'arbitrage et cadence des cycles.
- Deux actions : consulter le calendrier, ou créer un nouveau point projet.

Sortie : préparation, consultation de CR, calendrier, ou création.

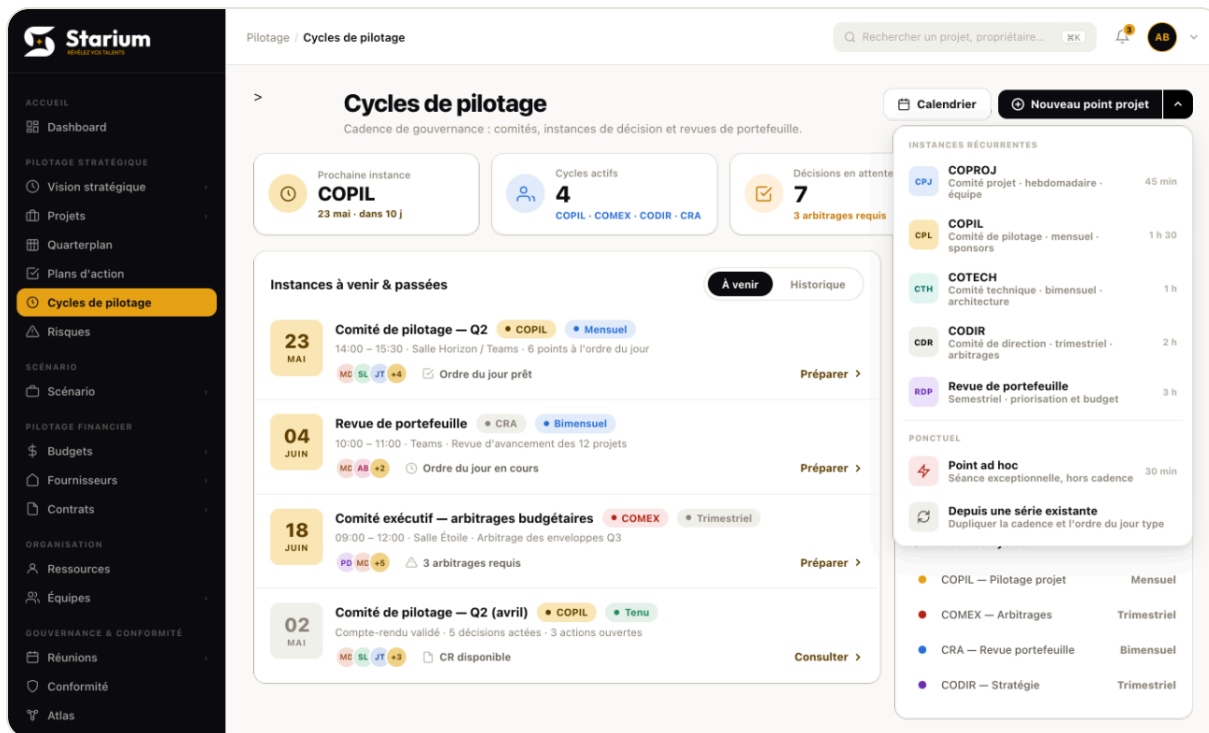

RÔLE

Split button : action par défaut à gauche, choix du type d'instance sous le chevron.

CE QUE FAIT L'ÉCRAN

- Le clic principal crée directement un COPROJ — le cas le plus fréquent, en un seul clic.
- Le chevron ouvre le menu typé : COPROJ, COPIL, COTECH, CODIR, Revue de portefeuille.
- Chaque entrée annonce sa cadence, son audience et sa durée standard : le choix se fait sans ouvrir la modale.
- Section « Ponctuel » séparée : point ad hoc hors cadence, ou duplication d'une série existante.
- Le menu se ferme au clic extérieur et à la touche Échap.

Sortie : modale de création pré-configurée selon le type choisi.

RÔLE

Création d'un comité projet. Toute la modale est pré-remplie par le type sélectionné.

CE QUE FAIT L'ÉCRAN

- Horaire 09:30, durée 45 min, récurrence hebdomadaire appliqués par défaut.
- Ordre du jour type du COPROJ pré-saisi et modifiable.
- Bandeau d'information : les actions ouvertes du dernier point sont reportées automatiquement.
- Deux validations distinctes : « Créer » (ajout à la liste) ou « Créer et préparer » (enchaîne sur la préparation).

Sortie : point ajouté en tête de liste avec son badge de type.

Nouveau point projet
Comité de pilotage - arbitrages et sponsors

Type d'instance *

COPROJ
Hebdomadaire - 45 min

COPIL
Mensuel - 1 h 30

COTECH
Bimensuel - 1 h

CODIR
Trimestriel - 2 h

Revue de portefeuille
Trimestriel - 3 h

Point ad hoc
Ponctuel - 30 min

Intitulé *

COPIL — à nommer

Date: 30/05/2025

Heure: 09:30

Durée: 45 min

Récurrence: Ponctuel, Hebdomadaire, Bimensuel, **Mensuel**, Trimestriel

Participants: MD Marc D., SL Sophie L., JT Julien T., AB Alice B., PD P. Durand, CM C. Martin

Ordre du jour

Annuler Créer et préparer ✓ Créer le point

RÔLE

Même modale, autre type : le contenu s'adapte entièrement au niveau de gouvernance.

CE QUE FAIT L'ÉCRAN

- Horaire 14:00, durée 1 h 30, récurrence mensuelle.
- Ordre du jour type orienté pilotage : synthèse, budget, risques majeurs, arbitrages.
- Le bandeau annonce la consolidation automatique des COPROJ tenus depuis le dernier COPIL.
- Démontre que le typage n'est pas cosmétique : il porte des règles métier.

Sortie : COPIL créé, consolidation des COPROJ programmée.

Nouveau point projet
Séance exceptionnelle, hors cadence

Type d'instance *

COPROJ
Hebdomadaire - 45 min

COPIL
Mensuel - 1 h 30

COTECH
Bimensuel - 1 h

CODIR
Trimestriel - 2 h

Revue de portefeuille
Trimestriel - 3 h

Point ad hoc
Ponctuel - 30 min

Intitulé *

Point ad hoc — à nommer

Date

30/05/2025

Heure

09:30

Durée

45 min

Récurrence

Ponctuel

Hebdomadaire

Bimensuel

Mensuel

Trimestriel

Participants

Marc D.

Sophie L.

Julien T.

Alice B.

P. Durand

C. Martin

Ordre du jour

Annuler

Créer et préparer

Créer le point

RÔLE

Séance exceptionnelle, hors cadence de gouvernance.

CE QUE FAIT L'ÉCRAN

- Récurrence forcée à « Ponctuel » : aucune série n'est générée.
- Durée courte par défaut (30 min), ordre du jour minimal : objet du point, décision attendue.
- Reste rattaché au cycle du projet pour ne pas échapper à la traçabilité.
- Couvre les incidents et les décisions urgentes sans polluer la cadence.

Sortie : point isolé, visible dans la liste, sans effet sur les séries.

Starium REVELEZ VOS TALENTS

Pilotage / Cycles de pilotage

Rechercher un projet, propriétaire...

Cycles de pilotage

Cadence de gouvernance : comités, instances de décision et revues de portefeuille.

Prochaine instance
COPIL
23 mai - dans 10 j

Cycles actifs
4
COPIL · COMEX · CODIR · CRA

Décisions en attente
7
3 arbitrages requis

Taux de présence
94%
12 derniers comités

Instances à venir & passées

30 MAI **COPROJ — Semaine 22** • COPROJ • Hebdomadaire
09:30 - 45 min - 5 points à l'ordre du jour - créé à l'instant
ME SL JT AB

23 MAI **Comité de pilotage — Q2** • COPIL • Mensuel
14:00 - 15:30 - Salle Horizon / Teams - 6 points à l'ordre du jour
ME SL JT +4 ☐ Ordre du jour prêt

04 JUIN **Revue de portefeuille** • CRA • Bimensuel
10:00 - 11:00 - Teams - Revue d'avancement des 12 projets
ME AB +2 ☐ Ordre du jour en cours

18 JUIN **Comité exécutif — arbitrages budgétaires** • COMEX • Trimestriel
09:00 - 12:00 - Salle Étoile - Arbitrage des enveloppes Q3
PO ME +5 ☐ 3 arbitrages requis

02 MAI **Comité de pilotage — Q2 (avril)** • COPIL • Tenu
Compte-rendu validé - 5 décisions actées - 3 actions ouvertes

Décisions en attente **7**

Rallonge budgétaire Prestataires
COMEX - 18 juin - +6 k€ demandés

Go/No Go Application Mobile
COPIL - 23 mai - lancement Q3

Renfort QA sur la recette
CRA - 4 juin - 1 ETP sur 6 sem.

Cadence des cycles

COPIL — Pilotage projet	Mensuel
COMEX — Arbitrages	Trimestriel
CRA — Revue portefeuille	Bimensuel
CODIR — Stratégie	Trimestriel

RÔLE

Confirmation de la création directement dans le contexte, sans changement d'écran.


CE QUE FAIT L'ÉCRAN

- Le point apparaît en tête de liste avec un flash visuel de 1,6 s.
- Il porte son badge de type, sa récurrence, son horaire et le nombre de points à l'ordre du jour.
- Les participants cochés dans la modale sont affichés en avatars.
- Un toast confirme l'action et rappelle l'intitulé créé.

Sortie : le point est immédiatement préparable.

18 Préparation depuis les cycles

ÉCRAN DE TRAVAIL

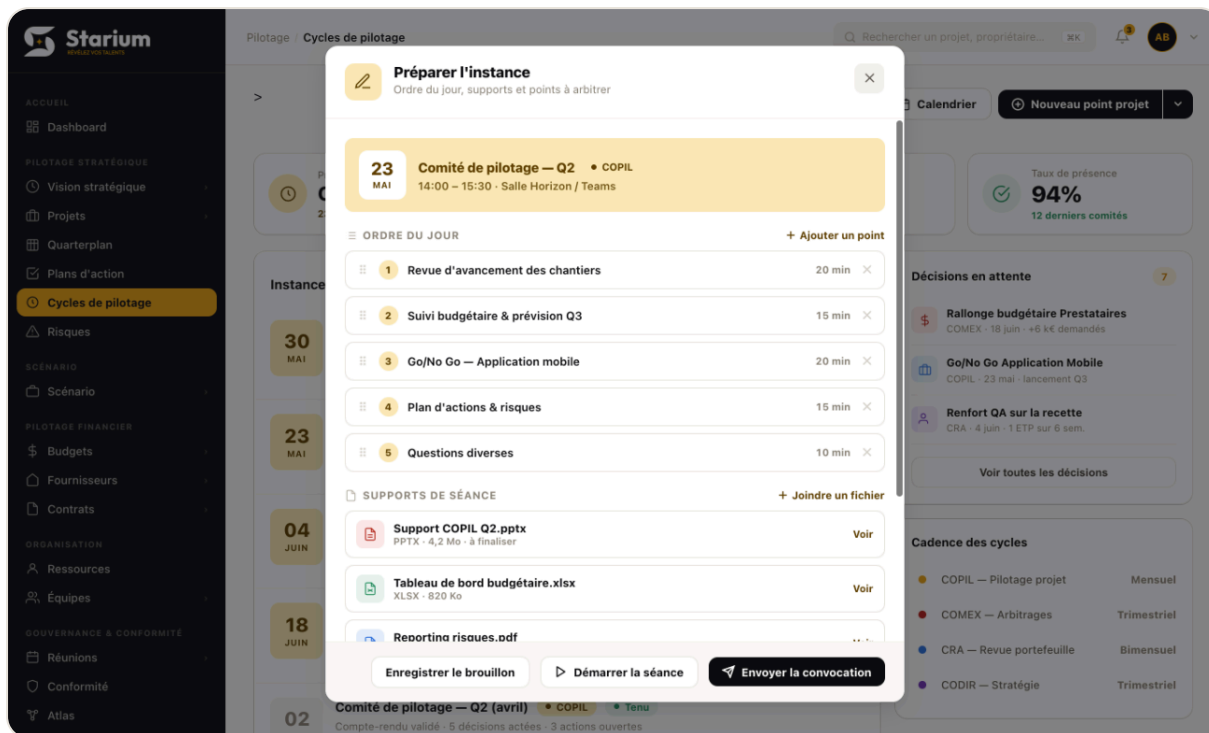


RÔLE

Même écran de préparation, atteint depuis la vue transverse.

CE QUE FAIT L'ÉCRAN

- L'ordre du jour est consolidé depuis les instances de niveau inférieur.
- Les décisions en attente d'arbitrage remontent automatiquement à l'ordre du jour.
- Les documents support sont rattachés point par point.
- Le brief de séance est diffusable aux participants avant la date.

Sortie : ordre du jour prêt, séance animable.

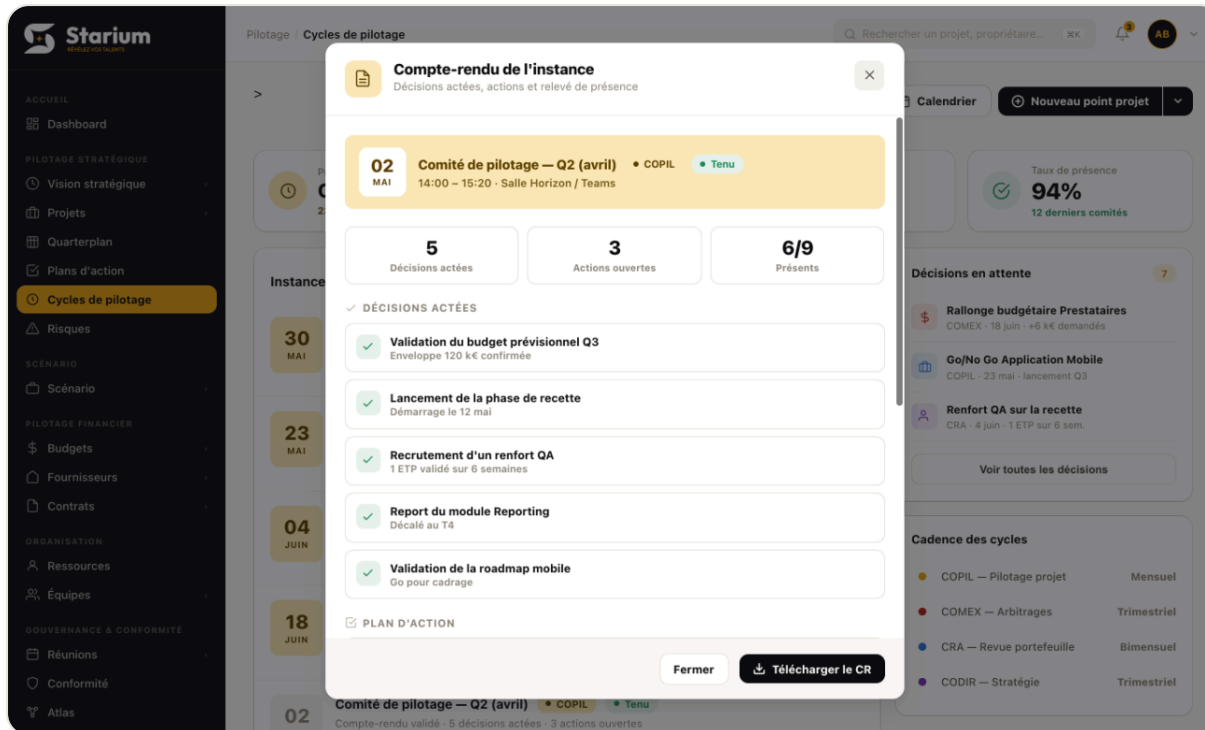

RÔLE

Restitution d'une séance close : ce qui a été décidé et ce qui en découle.


CE QUE FAIT L'ÉCRAN

- Synthèse chiffrée en tête : décisions, actions ouvertes, taux de présence.
- Décisions actées avec leur portée, actions avec porteur et échéance, présents et absents.
- Documents de séance attachés et téléchargeables.
- Contenu verrouillé : le CR diffusé ne se modifie plus.

Sortie : lecture seule. Les actions vivent dans le plan d'action.

20 Calendrier des instances

MODALE

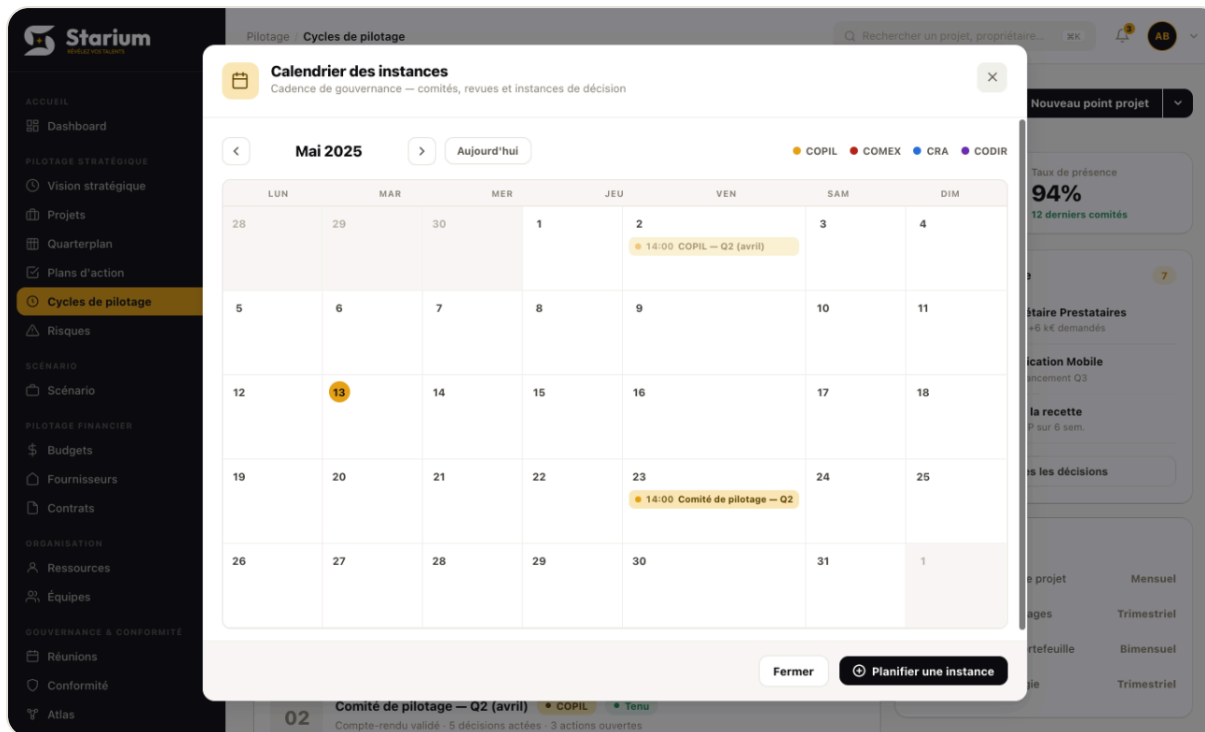

RÔLE

Vue mensuelle de la cadence de gouvernance.

CE QUE FAIT L'ÉCRAN

- Positionne toutes les instances du mois, typées par couleur.
- Permet de détecter les collisions de comités et les semaines à vide.
- Sert d'appui à la planification d'un nouveau point : on choisit la date en voyant la charge.
- Navigation mois par mois, retour au mois courant.

Sortie : lecture, ou création d'un point à la date choisie.
